

Aktueller Planungsstand des vierstreifigen Ausbaus der E233



1



Trassenverlauf

- neue Trasse
- vorhandene Trasse

PA 1: AS Meppen (A31) - Meppen (B 70) PA 5: o Löhningen (OU) – o Lastrup (OU)

PA 2: Meppen (B70) – w Haselünne

PA 6: o Lastrup – Cloppenburg (B68)

PA 3: w Haselünne – Kreisgrenze

PA 7: Cloppenburg (B68) – Cloppenburg (B213)

PA 4: Kreisgrenze – o Löhningen (OU)

PA 8: Cloppenburg (B213) – AS Cloppenburg (A1)

Auftraggeber:
Landkreis Emsland
Landkreis Cloppenburg

Kartengrundlage:
<http://maps.google.de>

Bearbeitung:
Ingenieurbüro Dipl.-Ing. H. Vössing GmbH
März 2011

Anschlussstellenkonzept


- Anschlussstellenkonzept wurde von Januar bis April 2011 erarbeitet
- Übermittlung an BMVBS zwecks Abstimmung

Rastanlagenkonzept

- Erstellung durch NLStBV unter Berücksichtigung der Privatinteressenten vor Ort (Autohöfe) und des Anschlussstellenkonzeptes
- Erstellung bis Juli 2011
- Abstimmung BMVBS

Unterlagen zur Linienabstimmung

- PA 4 auf neuer Trasse, daher sind Unterlagen zur Linienabstimmung zu erarbeiten
- Erstellung bis Juni 2011
- Abstimmung BMVBS

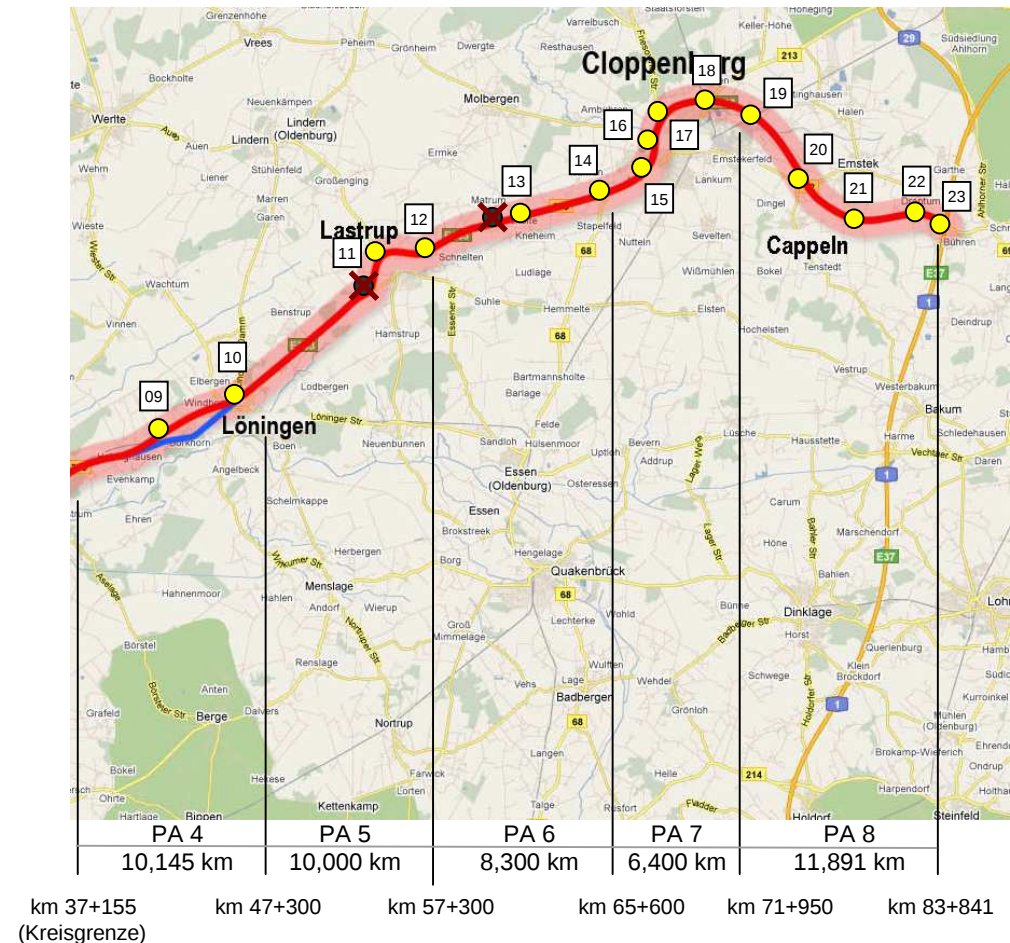

AS E 233 geplante AS entfallene AS (Trassen-optimierung)			Geplante Anschlussstellen im Landkreis Cloppenburg		
09	AS Lönigen-West	14	AS Stapelfeld	19	AS CLP-Industriegebiet
10	AS Lönigen-Ost	15	AS CLP-West	20	AS Emstek/Cappeln
11	AS Lastrup/Lindern	16	AS CLP-Molberger Straße	21	AS Cappeln/ ecopark
12	AS Lastrup-Essen	17	AS CLP-Nord	22	AS Emstek-Ost/ ecopark
13	AS Molbergen/ Kneheim	18	AS Bethen	23	AS Cloppenburg (A 1)



	PA 4 Kreisgrenze – o Lönigen (OU)	PA 5 o Lönigen (OU) – o Lastrup (OU)	PA 6 o Lastrup – Cloppenburg (B68)	PA 8 Cloppenburg (B213) – AS Cloppeburg (A1)
Projektvorbereitung				
Unterlagen zur Linienabstimmung	Übermittlung zum BMVBS im Juni 2011			
AS-Konzept	liegt zur Abstimmung dem BMVBS vor			
Rastanlagenkonzept	Erarbeitung durch NLStBV, ZGB bis Juli 2011			
Eingang Vermessungsdaten	Juni 2011	August 2011	März 2011	August 2011
Vergabeverfahren (Planung Verkehrsanlagen und LBP)				
Verhandlungstermine	17. Mai 2011	23. Juni 2011	09. Februar 2011	05. Juli 2011
Vergabe	30. Mai 2011	07. Juli 2011	21. Februar 2011	19. Juli 2011
Planungsleistungen				
Eingang Voruntersuchung	Dezember 2011	Januar 2012	Oktober 2011	Februar 2012
Scopingtermin	06. Juni 2011			
Projektkonferenz			06. Juni 2011	

Vorbereitende Anwohnergespräche

- Nieholte (09.02.2011)
- Kneheim (01.03.2011)
- Stapelfeld (14.03.2011)
- Helmighausen (17.03.2011)
- Steinrieden (29.03.2011)
- Burlagsberge / Elbergen (05.04.2011)

Ratsherreninformationsveranstaltung

- Information der Ratsherren (15.03.2011)

Öffentliche Informationsveranstaltungen

- Stadt Lönigen (07.04.2011)
- Gemeinde Lastrup (13.04.2011)
- Stadt Cloppenburg (14.04.2011)

Internetauftritt

- Erstellung eines Internetauftritts ist beauftragt.

Vignette

- „E233-Sponsor-Vignette“ im Mai 2011 eingeführt

