

Anlage zu TOP 6 Information zum Planungsstand E 233  
Verkehrsausschuss am 3.07.2014


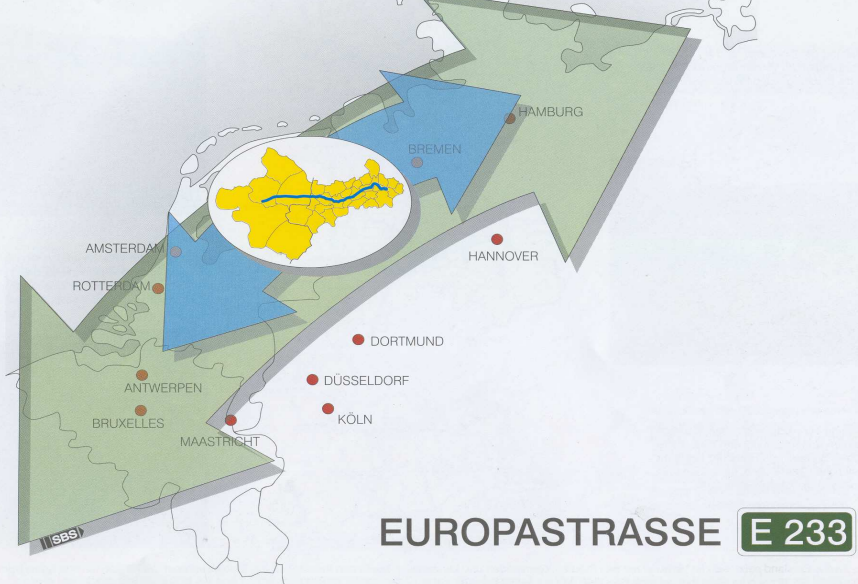


Schaubild zur Umsetzung der Planung der E 233



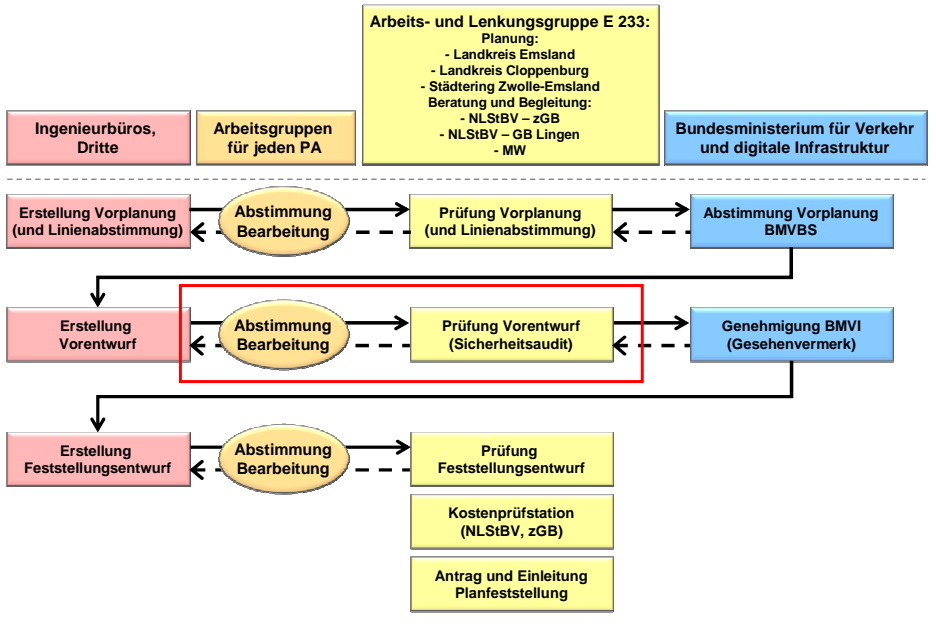

Terminplanung E 233  
Prüf- und Vorstellungszeiträume

Nr.	verantwortlich/ beteiligt		Revision	Anzahl Ausfertigungen	Dauer
1	Planer	ursprünglicher Termin Vorlage Lesefassung VE	Rev. 0		
2	LK CLP /Vössing	Prüfung Lesefassung VE	Rev. 0		ca. 2 Wo
3	LK EL	Prüfung Lesefassung VE	Rev. 0		ca. 4 Wo
4	Planer	Vorstellungstermin NLSIBV zGB	Rev. 0		
5	LK EL/Vössing	Weitergabe zur Prüfung an NLSIBV GB Lingen	Rev. 0		ca. + 1 Tag
	Puffer				
6	NLSIBV, GB Lingen	Prüfung Lesefassung VE und Aufstellung Prüfvermerk (ohne Unterschrift)	Rev. 0		2 Wo
7	NLSIBV, GB Lingen	Übergabe Prüfbericht VE an LK	Rev. 0		
8	LK CLP, LK EL / Vössing, Planer	Abstimmungstermin zu Prüfergebnissen (Lingen/Vössing) der ersten Lesefassung und Übergabe Prüfberichte an Planungs- büro	Rev. 0		1 Wo
9	Planer	Einarbeitung Prüfanmerkungen und Erstellung der vorläufigen Endfassung VE, Übergabe an LK	Rev. 1		3 Wo
10	LK CLP	Weiterleitung vorläufige Endfassung VE an Vössing	Rev. 1		ca. + 1 Tag
11	Vössing	Prüfung der Einarbeitung von Prüfanmerkungen Vössing	Rev. 1		3 Tage
12	LK EL, LK CLP/ Vössing	Weiterleitung vorläufige Endfassung VE an NLSIBV, GB Lin- gen	Rev. 1		+ 1 Tag
13	NLSIBV, GB Lingen	Prüfung Einarbeitung von Prüfanmerkungen NLSIBV, GB Lin- gen	Rev. 1		3 Tage
14	NLSIBV, GB Lingen	Weiterleitung NLSIBV zGB	Rev. 1	4-fach	ca. + 1 Tag
	Puffer				
15	NLSIBV zGB	Prüfzeitraum IBV	Rev. 1		4 Mon

PA 8

PA 6

PA 4

PA 5

Die Vorbereitung und Planung eines beschleunigten Ausbaus der  
grenzübergreifenden Europastraße 233  
zwischen Meppen (A31) und Emstek (A1)  
in der Ems Dollart Region  
(Projekt PlanInfra E 233)

wird unterstützt durch:

Unterstützt durch / Mede mogelijk gemaakt door:	
 INTERREG Deutschland Nederland	 INTERREG - Grenzregionen gestalten Europa Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung der Europäischen Union INTERREG - Grensregio's bouwen aan Europa Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie
 STEDENKRING EMSDOLLART STÄDTERRING	 EDR
 Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
<a href="http://www.deutschland-nederland.eu">www.deutschland-nederland.eu</a>	

